

CROIX-ROUGE MALIENNE



ACTIONS BASÉES SUR LES PRÉVISIONS (ABP)

Rapport de déclenchement PAP inondation

Déclenchement du PAP dans la région de Mopti,

Cercle de Djenné, Commune de Fakala,

sous-préfecture de SOFARA village de KAKA

Date : 04 au 08 Septembre 2022 à MOPTI

Date : Bamako, 15/09/2022

Préparé par :

Souleymane KONATE /

Coordinateur National FbF-CRM/Mali

Sommaire

Contexte/ Justification :.....	3
Résumé des Résultats.....	4
Ce qui a marché.....	5
Ce qui n'a pas marché.....	5
Contraintes et Difficultés.....	5
Ce que le programme a pu éviter.....	5
Recommandation.....	6
Situation des stocks :.....	6
Déroulement des activités.....	7
1) Déclenchement du PAP :.....	7
2) Premier Jour : Dimanche 4 septembre : Jour de voyage et rencontre des partenaires.....	7
3) Deuxième jour : Lundi 5 septembre : Début des actions anticipations.....	8
4) Troisième jour : Mardi 06 septembre, poursuite des activités de mitigation.....	9
5) Quatrième jour : Mercredi 07 septembre, finalisation des travaux.....	10
6) Atelier de restitution à l'endroit du comité de crise régional :.....	11
ANNEXES.....	12
Annexe2 :.....	12
Annexe 4 :.....	12
Annexe 5 :.....	13
Annexe 6 :.....	13

Contexte/ Justification :

La Croix-Rouge Malienne à l'instar de toute la société de la Croix-Rouge, est auxiliaire de pouvoirs publics. Ce mandat que l'État malien lui a conféré, lui d'agir dans le domaine humanitaire, notamment en situation d'urgence. Depuis sa fondation en 1965, la Croix-Rouge a posé beaucoup d'actions et à répondu aux différents événements sur lesquels elle est intervenue. Chaque année, la Croix Rouge Malienne et ses partenaires posent des actions visant à protéger les personnes touchées par les catastrophes naturelles au Mali. Ces interventions sont plus opportunes, pertinentes et efficaces que jamais. Afin de secourir davantage de personnes, la Croix-Rouge Malienne et ses partenaires de la Croix-Rouge danoise et de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge ont jugé nécessaire de mettre en place un mécanisme visant à anticiper sur les catastrophes, une nouvelle approche qui revoient leurs interventions face aux crises complexes auxquelles les populations sont confrontées. Il s'agira de la capacité d'adaptation et d'innovation pour anticiper les inondations et réduire de façon considérable les impacts sur la vie humaine, les habitats et les maladies hydriques.

Le protocole d'action précoce PAP est élaboré, avec comme période de mise en œuvre 4 jours avant l'arrivée de l'inondation. Ainsi les volontaires de la Croix-Rouge Malienne, les services techniques de l'État et les Communautés ont le temps de se préparer lorsque l'inondation arrivé, les personnes et les infrastructures sont hors d'atteinte et protégées. Un mécanisme de communication avec la Croix-Rouge Malienne et les services techniques de l'État permet de déclencher le processus dans une fenêtre de temps relativement court. C'est ce mécanisme qui a fait l'objet d'une activation dans la région de Mopti du 04 au 08 septembre 2022. Il s'agit du village de Kaka, dans la sous-préfecture de Sofara, cercle de Djenné que le mécanisme a été activé.

Résumé des Résultats

Résultats attendus	Résultats Obtenus	Observations	Leçons apprises
L'alerte précoces est donné par le Comité national de crise en réunion	Le processus de déclenchement a été respecté.	Point focal. DNH/ DRH/ CRM/ PNS Déclenchement : 16h30 de Bamako. Arrivée de la Décision : 17h15 à Mopti	Réunion en présentielle et en ligne sur team. Discussion sur le choix de zone d'intervention
Un groupe WhatsApp est créé pour le comité de crise national et régional regroupant tous les services techniques, gouvernorat et CRM	Le canal de communication du déclenchement a été respecté.	Bonne circulation de l'information entre les comités et le terrain. Les Services Techniques ont compris le mécanisme	Clarification de la différence entre les actions précoces et interventions de réponse poste catastrophe.
Les stocks sont acheminés sur le site dans un entrepôt de Sofara	L'ensemble des stocks ont été transporté dans deux camions vers le site dans le délai.	Locations de deux camions pour transporter tous les stocks vers le site	
Les plans de communication sont exécutés par les radios et le reporteur vidéo.	Les 8 radios choisies, 6 à SEVARE, 1 à Djenné et 1 à Sofara. Un reporteur a accompagné la mission terrain.	Diffusion en français et aux langues locales les messages radiophoniques pendant la période d'intervention.	Diffusions facilitées par la DRH de Mopti.
Les volontaires FbF ont procédé aux sensibilisations et évaluation de vulnérabilité des ménages	16 volontaires ont mené les activités conformément au PAP.	Besoin d'impliquer plus de volontaires sur le programme en fin de facilité le déroulement des activités.	Le nombre des volontaires FbF insuffisant pour le volume des travaux sur le terrain.
Installation des kits abris pour les ménages évacués	Les volontaire/agents DRPC/ membres communautés ont procédé à l'installation des kits	Temps insuffisant pour l'installation de tous les kits abris	Premier jour d'installation coïncidé au jour de foire de Sofara. L'installation d'un kit prend plus de temps que prévu
Les ménages les plus exposés sont évacués	23 ménages et plus ont été évacués et regroupés dans un endroit protégé.	Certains ménages s'étaient mobilisés vers les grandes familles à l'intérieur du village.	Equipe des volontaires d'évaluation ont pu aider à trouver les ménages à évacuer.
Les volontaires et les membres de la communauté mènent les actions de mitigation en remplissant les sacs et protègent les maisons	Les volontaires et la communauté ont participé activement aux activités de protection des maisons	Engagement réel de la communauté et équipe de la DRPC.	Les membres des communautés sont assez engagés à protéger eux même leurs maisons avec les sacs remplis de sables ou banco.
Les AQUATABS/ eau de javel/ grésils sont distribués	Les kits sanitaires ont été distribués à travers le point focal volontaire de la CRM.	Temps insuffisant pour toutes les distributions.	Avoir plus de temps pour exécuter l'ensemble des activités de mitigation. (Protection, Evacuation et distribution)

Ce qui a marché

- A. La collaboration avec les services techniques de l'État (DNH, MALI-MÉTÉO, DGPC, DNDS, DNDSES et CNAP) ;
- B. Le mécanisme de déclenchement.
- C. La mobilisation des acteurs régionaux et locaux clés du projet ;
- D. La bonne compréhension du mécanisme FbF ;
- E. Le déploiement des volontaires formés dans la zone d'intervention ;
- F. Les passages des messages radio et sensibilisation communautaire sur les mesures à prendre face aux inondations ;
- G. L'organisation du travail en trois équipes de 16 personnes, l'évacuation et la communication.

Ce qu'il faut améliorer

- A. La protection : l'accès aux sables/bancos dans certains endroits à protéger pour exécuter l'ensemble de la protection de tous les ménages et infrastructures exposés ;
- B. L'installation de vingt-cinq (25) tantes en deux jours par une équipe de 16 volontaires selon les directives du PAP (nombre insuffisant des volontaires) ;
- C. La distribution des sacs vides (distribution des mêmes quantités de sacs vide par ménages alors que l'exposition aux dangers ne sont pas identiques) ;
- D. L'implication de la mairie dans la recherche des bancos pour les remplissages des sacs vides.

Contraintes et Difficultés


- A. Disponibilité rapide de fond pour les actions rapides ;
- B. Confusion entre le comité de crise régional FbF et le comité de veille existant dans la branche ;
- C. Exécution des toutes les activités précoces dans le lead-time (4 jours) ;
- D. Regroupement des membres du comité de crise national/ régional en cellule d'urgence ;
- E. Difficultés d'accès à la zone d'intervention zone de chargement du sable loin des habitations (2.5 km par pirogue) ;
- F. Difficulté d'accès aux bancos dans la ville de SOFARA pour le remplissage des sacs ;
- G. Adaptation au contexte du terrain pour faire la distribution avec la communauté ;
- H. Contrainte de sécurité (zone sous surveillance des groupes armés).

Ce que le programme a pu éviter

- La perte en vies humaines soit plus de 3 045 personnes, un village et deux quartiers de Sofara sauvés ;
- La destruction des habitats et les biens des personnes (sensibilisations et évacuations précoces) ;
- L'effondrement des infrastructures publique (édifices publics protégés).


Personnes touchées :

Taille de ménage	Nombre
3ème quartier	740
Bellokim	343
Kaka	1962
Total général	3045



Nombre de ménages secourus :

Nombre de ménages par village	Nombre
3ème quartier	46
Bellokim	26
Kaka	199
Total général	271

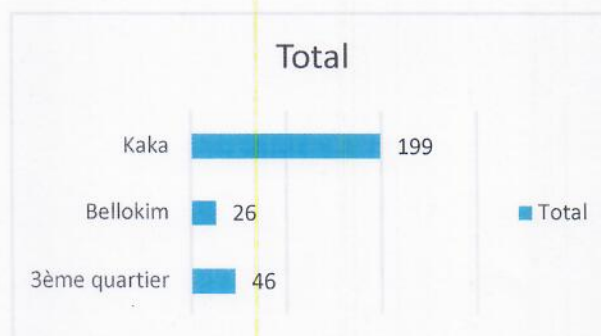

Recommandation.

1. Revoir le lead-time avec la DNH qui n'est pas forcément 4 jours dans toutes les localités du Mali ;
2. Prioriser la distribution des sacs vides pour la protection des maisons et édifice publiques ;
3. Augmenter la quantité des nattes qui sont également utilisées lors des installations des tantes ;
4. Revoir le nombre d'action proposée (Evacuation, Protection, Distribution de produits) ;
5. Ajouter les plastiques des protections des documents civils dans les stocks ;
6. Mettre en place des rencontre périodiques pour les membres du CCR ;

Situation des stocks :

N°	Désignation	Quantité	Utilisé	En stock
1	Nattes Plastiques 2 Places 180 x 90 cm	210	210	0
2	Couvertures 2 places 80% COTTON, 20%POLYESTER, 1.2x1.8m	210	210	0
3	Moustiquaires moustiquaire imprégné d'insecticide	1 000	542	458
4	Kits abris d'urgence (Standarts FICR)	30	25	5
5	Kits cuisine (Standarts FICR)	30	25	5
6	Pelles Ronde Métallique Manche en Bois	20	16	4
7	Sacs de sable vides (50 kg)	5 000	5 000	0
8	Gresil (bouteille 90 cl)	50	46	4
9	Brouettes en Métal	10	5	5
10	Eau de javel (bouteille)	1 000	868	132
11	Aquatabs (cartons)	50	46	4
12	Imperméables Complet avec Bande réfléchissante et logo de la CRM	50	20	30
13	Paires de bottes PVC rouge chaussures de Travail	50	20	30
14	Gants protège main pour les maçons	50	20	30
15	Lampes torches solaires	10	0	10
16	Power Bank HEPU 10000mh	5	0	5
17	Kits de premier secours	5	0	5

Déroulement des activités

1) Déclenchement du PAP :

Le jeudi 1^{er} septembre 2022, la situation hydrologique était caractérisée par la poursuite de la montée des niveaux d'eau sur tous les cours d'eau à l'exception de Banankoro sur le Niger où le niveau est stationnaire. A cette date, les niveaux d'eau observés étaient supérieurs à ceux de l'année dernière sur le Sankarani à Sélingué-amont, sur le Baoulé à Bougouni, sur le Bani à Douana et à Sofara, sur la confluence Bani/Niger à Mopti et le niveau est similaire à celui de 2021 sur le Niger à Bamako.

La CRM a été averti à travers le point focal FbF à la DNH, que la situation est alarmante à Sofara sur le Bani où la cote d'alerte orange (633 cm) est à -3 cm. Et que la montée franche du niveau d'eau observée dans le haut Bani (Bagoè et Baoulé) pourrait engendrer des inondations sur le Bani moyen dans le cercle de Djenne dans les semaines à venir, si cette tendance se confirme.

En effet, le comité de crise national présidé par le Secrétaire Général de la CRM s'est réuni dans le centre d'opération d'urgence de la CRM avec les PNS pour prendre la décision de déclencher le PAP d'inondation.

La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR) à travers son cluster de Niger a été informé du déclenchement sur la base des informations de la DNH.



1^{ère} réunion dans la salle de crise du Centre des Opérations d'Urgences de la CRM. Personnes de gauche à droite : Secrétaire Général, Représentant PNS, Coordinateur National FbF, RROps Manager Mali et National Society

2) Premier Jour : Dimanche 4 septembre : Jour de voyage et rencontre des partenaires

Le dimanche 4 septembre, une équipe FbF composée de Coordinateur National FbF, Chargé des préparations et gestion de catastrophes et Analyste de données du siège de la Croix-Rouge Malienne s'est mobilisé vers la branche locale. Une fois sur le terrain, l'équipe a rapidement appelé tous les membres du comité de crise régionale pour leur faire le point de la situation. Ensuite, un groupe WhatsApp a été créé et regroupant tous les membres du comité de crise régionale. Aussitôt, l'équipe s'est rendue dans la direction régionale de l'hydraulique vers 20h où le personnel de la DNH s'était réuni encore au bureau. L'équipe a eu une séance de travail avec le responsable de la direction régionale de l'hydraulique. Sur la conception et la révision des messages et des communiquer qui seront diffusés dans les différentes radios locales. Après cette séance de travail, nous avons voulu rencontrer le Conseiller aux affaires économiques et financières (CAEF) du gouverneur mais cela n'était plus possible par ce que la nuit était déjà avancée.

Résumé des activités de la journée

- Coordination des activités des volontaires pour le jour suivant ;
- Rencontre du Directeur régional de l'hydraulique pour vérifier les messages qui seront diffusés aux radios, déterminer les nombres de messages à diffuser et établir les contrats : choix restreint de radios arrivent à émettre dans le site et environnant ;
- Vérifier et contrôler les stocks pré-positionnés (Moustiquaire, Aquatab, Eau de javel, Gresil, Kit abris d'urgence, Kits cuisine, Couvertures, Nattes, Sacs de sable vide, Pelles, Brouettes, Marteaux, cordes, points)
- Contacter et mobiliser les volontaires (Kaka, Sofara et Mopti) pour la réussite des activités à venir ;

3) Deuxième jour : Lundi 5 septembre : Début des actions anticipations

Très tôt le matin, les 16 volontaires FbF accompagnés des membres du comité directeur ont procédé au chargement des véhicules. Les volontaires ont commencé à faire ressortir tous les kits qui étaient stockés dans l'entrepôt de Mopti. Deux camions ont été louer pour l'acheminement des kits sur le site, plus une camionnette qui devrait transporter les volontaires sur le site. Après le chargement des kits, nous avons pris la route vers Sofara situé à 67 km de SEVARE à 09h30.

La protection civile de Mopti a déployé 16 agents pour accompagner notre mission avec les équipements et une Drone pour la capture des images aériennes.

Sur le site à Sofara nous avons d'abord commencé à recevoir les sous-préfets. Le sous-préfet sortant et le nouveau sous-préfet étaient tous présents. Ce qui a facilité notre induction, car le sous-préfet sortant était déjà au courant du programme FbF et qui avaient déjà briefé son remplaçant. Nous avons eu une séance avec eux en leur expliquant l'alerte et notre mode d'intervention. Ensuite, nous avons fait une visite terrain ensemble avec le sous-préfet en traversant le fleuve par pirogue pour se rendre dans le village de KAKA où le chef de village et ses conseillers nous attendaient. Une fois dans le village, là également c'étaient des protocoles d'introduction des activités à mener dans les jours prochains.

Le chef de village dans son intervention a félicité la CRM pour son intervention dans son village. Selon le Chef, la Croix-Rouge est venue au bon moment, car mieux vaut voir que d'entendre à distance. Après son introduction, nous avons reçu son feu vert pour commencer les activités.

Et là, nous avons mis en place trois (3) groupes de travaux avec les 16 volontaires de la CRM et l'équipe DRPC.

Un premier groupe qui devrait s'occuper à faire les sensibilisations dans les ménages.

Un 2^{ème} groupe qui devrait s'occuper à faire l'évaluation des vulnérabilités des ménages.

Et un 3^{ème} groupe qui devra s'occuper de la gestion des kits, notamment l'installation des Brouettes avec les membres de la communauté et l'arrangement de kits dans l'entrepôt de Sofara.

Le 2^{ème} groupe était également chargé de choisir dans le village les espace/endroit que nous pouvons choisir pour l'installation des tantes abris en cas de besoin d'évacuation.

Ensuite nous avons posé quelques questions au chef de village et ses conseillers, à savoir s'il existe dans le village des sables ou bancos pour le remplissage des sacs, ce qui était déjà disponible mais à plus de 2 km du village et accessible à pirogue. Nous avons également demandé à savoir les chefs de ménages qui veulent quitter leurs maisons pour d'autres maisons ou vers nos tantes abris. Et nous avons également

demandé les édifices ou les infrastructures publiques qui sont susceptibles d'être protégés par le programme.

Résumé des activités de la journée

- Echanges avec la DRH de Mopti sur les côtes d'alertes de Sofara ;
- Réunion du Comité de crise local (présence du sous-préfet de Djenné et les agents de la Protection civile de Mopti) ;
- Chargement du matériel dans les (2) camions par les volontaires et l'équipe du comité directeur ;
- Départ pour Sofara à 09h30.
- Réunion avec le chef de village et ses conseillers ;
- Début des diffusions des messages radios dans les différentes localités ;
- Installation des volontaires et l'équipe pour passer la nuit et préparer la journée de l'activation.



Arriver de l'équipe FbF dans le village de Kaka avec les membres de Gouvernorat et la Mairie
Rencontre avec le chef du village et les membres de la communauté

4) Troisième jour : Mardi 06 septembre, poursuite des activités de mitigation

Les activités de la 3^{ème} journée se sont consacrées essentiellement sur l'installation, la distribution des sacs de sables vide ainsi que les sensibilisations communautaires. Très tôt le matin nous avons acheminé l'ensemble des kits abris, kits cuisine et autres stocks vers le village de Kaka par les pirogues. Ainsi, les volontaires ont commencé à établir la liste des bénéficiaires. Et pour faciliter les activités, nous avons divisé les volontaires en 2 grands groupes. Un groupe qui s'occupe de la distribution. Et l'autre groupe qui s'occupe de l'installation des tentes. Les travaux ont été facilités par les équipes de la protection civile de Mopti et les autres membres de la Communauté. Nous avons distribué des sacs vides à des ménages.

Le le conseiller du chef de village a beaucoup facilité cette activité, en précisant le nombre de quantités de sacs vides à distribuer dans les ménages qui en ont besoin.

Nous avons pu installer en ce jour deux tentes et tracer l'emplacement pour un 3^{ème} qui devrait être installé le jour suivant.

Au même moment, nous nous sommes dirigés vers le 3^{ème} quartier de Sofora où il y avait une alerte sur la montée des eaux. Là également, nous avons fait une visite terrain avec les sous-préfets. Et le SGAL de la mairie de Sofara. Pour examiner le besoin essentiel des ménages et ces besoins étaient au tour des sacs vides dont les communautés avaient besoin pour protéger leur maison. Alors nous avons décidé de distribuer 30 sacs vides dans chaque mélange concerné.

Résumé des activités de la journée

- Acheminement des stocks dans le village de Kaka par pirogues
- Elaboration d'un plan de distribution avec les membres de la communauté ;
- Choix des ménages qui seront évacués
- Installation des kits abris pour les ménages se trouvant dans les baffons ;
- Distribution des sacs vides dans les quartiers de Bellokim et 3^{ème} quartier ;
- Travaux de protection de la mosquée de Kaka et quelques maisons ;
- Interviews des bénéficiaires pour le reportage final ;



Activités de distribution et l'installation des tantes abris

5) Quatrième jour : Mercredi 07 septembre, finalisation des travaux

Les activités de mitigation ont continué dans les différents endroits. Nous avons pu installer 5 tantes avec les membres de la communauté qui ont eux aussi appris à faire l'installation. Nous avons ensuite donné l'instruction aux membres de communauté de continuer à installer les autres avec les volontaires locales. Après cela, nous avons procédé à la remise symbolique de kit à abri et kit de cuisine.

De l'autre côté du fleuve dans le quartier de Sofara ville, au 3^{ème} quartier, les activités de protection des maisons avec les sacs vides ont continué. Nous avons pu protéger une mosquée et le centre du marché des bétails de Sophora.

Résumé des activités de la journée

- Suite des travaux de mitigation des risques des inondations ;
- Remise des kits abris et cuisines aux ménages évacués ;
- Faire le tour du village par pirogue pour observer la montée de l'eau dans les ménages ;

- Faire l'interviews du chef du village sur les activités de la CRM ;
- Envoyer l'invitation aux services technique pour la réunion de restitution ;



Activités de protection des maisons avec les sacs de bancos

6) Atelier de restitution à l'endroit du comité de crise régional :

Après la phase terrain, une restitution a été fait à l'endroit du comité de crise régional avec les représentants de la localité de Sofara. La rencontre avait pour objectif de :

- ✓ Expliquer aux membres du comité de comité de crise régional les activités qui sont déroulées à Kaka ;
- ✓ Recevoir les observations des responsables locales sur les activités déroulées ;
- ✓ Discuter ensemble de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché.



*Atelier de restitution de la mission avec les services techniques
Protection de la mosquée de Sofara*

ANNEXES

Annexe1

Liste des membres du Comité de Crise National

N°	Prénom et Nom	Contact	Fonction
1	Ousmane Diallo	70 14 15 75 / 66 71 82 73	Chef Cabinet du Gouverneur
2	Ali Dia	76 03 19 09	Président CRM Région
3	Alou SAMAKE	79 42 40 67	Secrétaire Général Régional
4	Noumouké Dembele	76 31 01 54	Directeur de la DRPC
5	Moussa Alassane	66 76 03 51	Directeur de la DRDSES
	Pierre Kassogué	74566566	Directeur de la DRH
	Abou Sanogo	72951345	Chef Station Météo
	Dr Felix Diarra	76033920	Chargé de Planification

Annexe2 : Liste des membres du Comité de Crise Régional

N°	Prénom et Nom	Contact	Fonction
1	Ousmane Diallo	70 14 15 75 / 66 71 82 73	Chef Cabinet du Gouverneur
2	Ali Dia	76 03 19 09	Président CRM Région
3	Alou SAMAKE	79 42 40 67	Secrétaire Général Régional
5	Namaké DEMBELE	76 31 01 54	Directeur de la DRPC
	Moussa Alassane	66 76 03 51	Directeur de la DRDSES
	Pierre Kassogué	74 56 65 66	Directeur de la DRH
	Abou Sanogo	72 95 13 45	Chef Station Météo
	Dr Felix Diarra	76 03 39 20	Chargé de Planification

Annexe 4 : Liste des membres de l'équipe d'intervention (volontaires FbF Mopti)

N°	Prénom	Noms	Contact	Lieu
1	Mamadou	Dicko	66 92 25 22	Sevare
2	Aly	Diarra	76 12 63 22	Sevare
3	Moussa	Coulibaly	79 10 64 79	Sevare
4	Allaye	Sidibé	79 99 40 81	Sevare
5	Kadia	Kanssaye	74 10 77 86	Sevare
6	Ramata	Guitteye	72 40 17 58	Sevare
7	Mariam	Touré	76 80 25 25	Sevare
8	Nia	Afa mahamane	76 54 40 15	Sevare
9	Sidi	Guindo	82 38 70 73	Sevare
10	Oumou	Diarra	72 75 08 26	Sevare
11	Ibrahim	Maiga	60 84 39 91	Sevare
12	Aboubacrine	Maiga	91 36 45 49	Sevare
13	Samba	Teme	72 80 24 54	Sevare
14	Mama	Nafogou	76 22 09 47	Sevare
15	Boubacar	Dao	83 45 14 95	Sevare
16	Lassine	Farota	75 12 62 80	Sevare

Annexe 5 : Liste des radios retenues pour le passage des communiqués DNH

N°	Nom de la radio	Contact	Fréquences
1	RADIO ORTM	21 42 00 76 / 21 42 05 71	
2	RADIO KAOURAL	21 43 13 26	100.5Mhz
3	RADIO KONARI	21 74 23 83	105.4Mhz
4	RADIO JAMANA Mopti	78 50 58 38 / 61 14 67 30	91.0Mhz
5	RADIO MARIA	21 74 94 38 / 66 82 82 98	101.2Mhz
6	RADIO JAMANA DJENNE	21 43 01 49	91.0Mhz
7	RADIO SAGHAN	73 33 33 30 / 66 66 61 66	91.2Mhz
8	RADIO KOOLOL FAKALA	74 21 38 05	

Les communiqués ont été diffusés trois fois par jours pendant toute la période d'intervention en français, Bozo, en Dogon, Bamana, Peul, Tamachèque, Sorail et Bomou.

Annexe 6 : Liste du Comité de crise local de Sofara

N°	Prénom et Nom	Contact	Fonction
1	Sory Coulibaly	78 61 85 67	Président CRM de Sofara
2	Brehima Kourouma	73 31 98 20	Etat (Sous –préfet de Sofara)
3	Kadidia Kané	79 19 95 71	DRH
4	Moctar Tall	79 10 60 49	DRSD
5	Ousmane Kontao	76 18 18 10	DRA
6	Monsieur le Maire	76 32 06 40	Mairie de Sofara
7	Yaya Konekehou		CRM Kaka
8			Conseiller du Village
9	Mariam Konakeou	94 10 23 83	Kaka
10	Moussa Sofara	66 15 83 74	Kaka
11	Djéguiné Konaké	73 43 42 95	Kaka

Validé par le secrétaire Général de la CRM :



Monsieur Nouhoum MAIGA
